




1. Prosimy o potwierdzenie, że studnia Sp 2.25 i pozostałe studnie i rurociągi kanalizacji deszczowej projektowane w ulicy Ogrodowej nie wchodzą w skład zamówienia

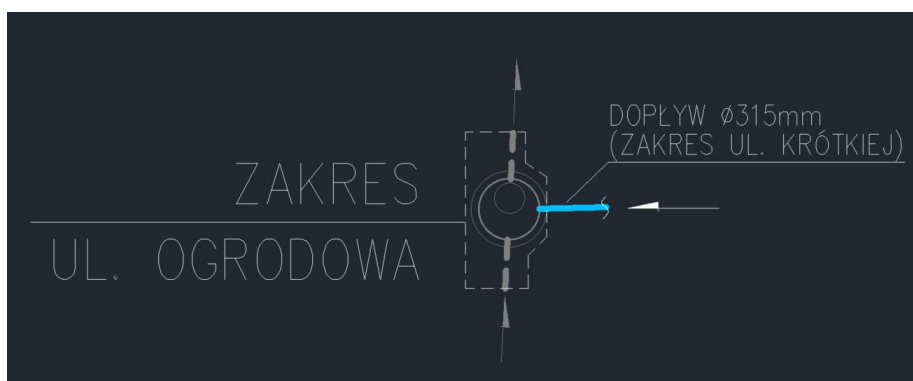

System odwodnienia (sieć kanalizacji deszczowej) w ul. Krótkiej kończy się na włączeniu kanału o średnicy Dn315mm do studni Sp2.25, która to studnia jest w zakresie projektu odwodnienia ul. Ogrodowej. System odwodnienia prowadzony w ul. Ogrodowej (ze studnią rewizyjną Sp2.25), jest poza zakresem realizacji systemu odwodnienia w ul. Krótkiej.

Taki też zakres jest podziany w Przedmiarze Robót i Kosztorysie Inwestorskim.

- Ze względu na rozbieżności na planie sytuacyjnym i profilu prosimy o potwierdzenie, że przyłącze wodociągowe do W1.7 ma średnicę dn 40 mm.

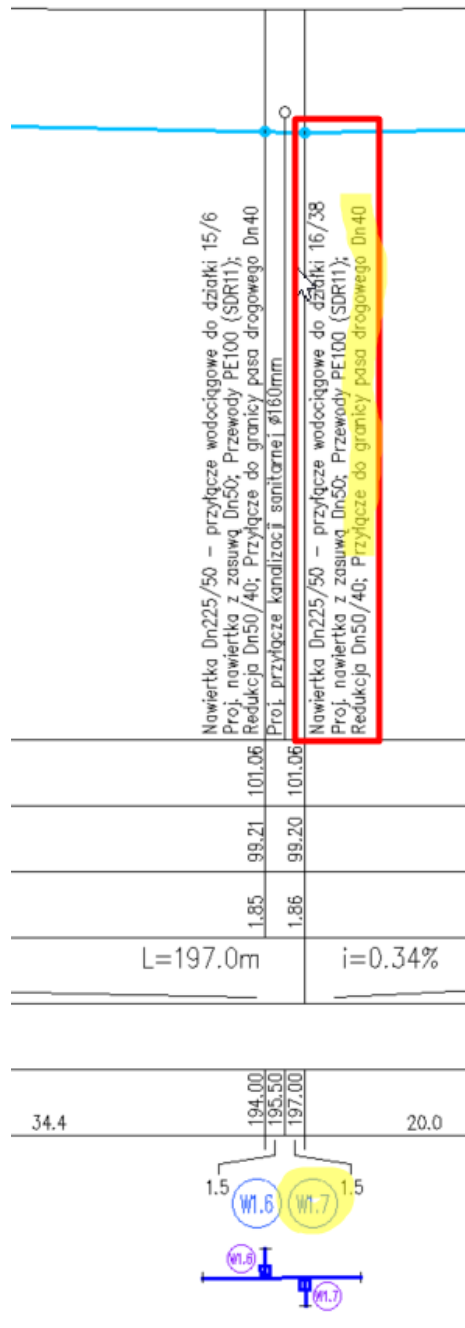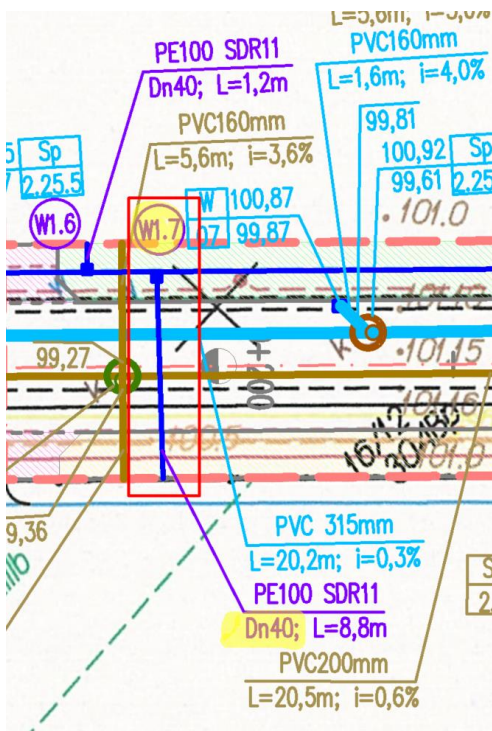

Nie ma rozbieżności – dokumentacja przewiduje nawiertkę Dn225/50, za nawiertką należy zastosować redukcję Dn50/40, a za redukcją należy poprowadzić przewodami o średnicy Dn40 przyłącze wodociągowe do granicy pasa drogowego.
